


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
по выполнению показателей планов-графиков
реализации областных государственных программ
за 12 месяцев 2020 года

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 12 месяцев 2020 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 95% от планового значения.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались подпрограммы и основные мероприятия, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 17 ОГП выполнены все показатели планов-графиков реализации, по 15 ОГП не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации.

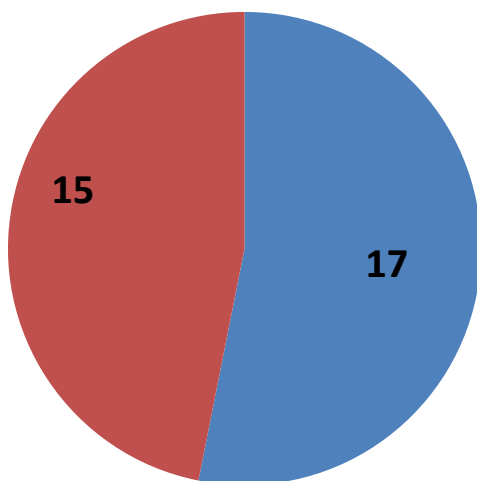

■ выполнены все показатели планов-графиков реализации

■ не выполнен один или несколько показателей планов-графиков реализации

Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации за 12 месяцев 2020 запланировано 773 показателя, 77 (10%) из них не выполнены, 5 невозможно оценить по причине отсутствия статистической информации.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.

1. Областные государственные программы, по которым выполнены все показатели планов-графиков

1.1. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 4 показателя.

1.2. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя.

1.3. «Управление государственными финансами Смоленской области». В составе одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

1.4. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области». В составе трех основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 16 показателей.

1.5. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров». В составе семи основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 19 показателей.

1.6. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области». В составе двух подпрограмм в отчетном периоде запланировано 4 показателя.

1.7. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 23 показателя.

1.8. «Местное самоуправление в Смоленской области». В составе четырех основных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

1.9. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области». В составе двух подпрограмм предусмотрено 6 показателей.

1.10. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области». В составе двух основных мероприятий предусмотрено 4 показателя.

1.11. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 19 показателей.

1.12. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области». В составе пяти основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 24 показателя.

1.13. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 7 показателей.

1.14. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия предусмотрено 11 показателей.

1.15. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области». В составе шести основных мероприятий предусмотрено 15 показателей.

1.16. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 3 показателя.

1.17. «Информационное общество Смоленской области». В составе одиннадцати основных мероприятий предусмотрено 33 показателя.

2. Областные государственные программы, по которым не выполнены отдельные показатели планов-графиков

2.1. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области». В составе пяти подпрограмм в отчетном периоде предусмотрен 31 показатель, 1 показатель не выполнен.

Подпрограмма «Семейно-демографическое развитие»:

- Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет); план – 1,416, факт – 1,133.

Причина – снижение рождаемости в Смоленской области в связи со снижением численности населения репродуктивного возраста, увеличением возраста вступления в брак, оттоком учащейся молодежи и миграционным оттоком населения, низким уровнем жизни населения и высоким уровнем женской занятости, а также рядом других факторов.

2.2. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области». В составе четырех подпрограмм предусмотрено 65 показателей, не выполнено 8 показателей.

Подпрограмма «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»:

- Валовой сбор льноволокна в хозяйствах всех категорий в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн); план – 5,62, факт – 1,9.

Причина – неблагоприятные погодные условия привели к гибели посевов, а также снижению урожайности в СХО и КФХ в сравнении с 2019 годом на 25% и 12% соответственно.

- Производство молока в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн); план – 173,9, факт – 159,9.

Причина – сокращение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах на 10%.

- Количество молодых специалистов, получивших единовременное областное государственное пособие (человек); план – 14, факт – 12.

Причина – отсутствие заявок на молодых специалистов.

- Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня функционирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса (единиц); план – 5, факт – 3.

Причина – отмена мероприятий в результате сложной эпидемиологической ситуации.

- Объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку семян рапса (тыс. тонн); план – 20,2, факт – 10,6.

Причина – в 2020 году планировалось увеличить посевную площадь рапса с 12 тыс. гектаров до 20,1 тыс. гектаров. Однако сложные погодные условия весной 2020 года (затяжные дожди и низкие температуры) не позволили провести сев ярового рапса в оптимальные агрономические сроки, что привело к недобору семян рапса.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Смоленской области»:

- Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы, на строительство жилого дома, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – проектно-сметная документация разработана, но положительное заключение государственной экспертизы не получено.

- Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения в сельской местности, всего (километров); план – 8,65, факт – 5,95.

Причина – поздние сроки заключения контракта.

- Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики (человек); план – 3, факт – 0.

Причина – отказ от мероприятия, заключено дополнительное соглашение с МСХ на обнуление лимитов. Уведомление от МСХ России получено после последней правки ОГП.

2.3. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».

В составе пяти основных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 28 показателей, не выполнено 9 показателей.

Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»:

- Количество запроектированных объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (ед.), план – 1, факт – 0.

Причина – проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

- Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имевших круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км), план – 10, факт – 0.

Причина – в связи со значительной потребностью средства, запланированные на строительство (реконструкцию), были перераспределены на ремонт.

- Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (ед.), план – 2, факт – 1.

Причина – проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

- Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км), план – 2, факт – 0.

Причина – ввод объекта планируется в 2021 году.

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

- Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений Смоленской области, на территории которых расположены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (км), план – 8, факт – 6.

Причина – в муниципальных образованиях выполнен ремонт участков дорог, которые изначально не планировались к ремонту. Изменения в плановый показатель своевременно не внесены.

- Количество запроектированных объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (ед.) местного значения в границах города Смоленска (км), план – 3, факт – 0.

Причина – ввиду значительной потребности средства, запланированные на проектирование, были перераспределены на содержание.

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Смоленска (км), план – 4, факт – 2,159.

Причина – в связи со значительной потребностью средства, запланированные на ремонт, были перераспределены на содержание дорог.

Основное мероприятие «Совершенствование управления дорожным хозяйством»:

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений) (км), план – 3,5, факт – 3,3.

Причина – некорректная разработка ПСД в муниципальном образовании – ремонту подлежало 3,3 км, ПСД разработана на 3,5 км. Плановый показатель установлен в соответствии с ПСД.

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Смоленской области»:

- Общий пробег автобусов по убыточным пригородным и межмуниципальным маршрутам (км), план – 6 585 230,2, факт – 4 029 721,1.

Причина – резкое снижение пассажиропотока и сокращение количества рейсов на маршрутах в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер на территории Смоленской области.

2.4. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области».

В составе трех подпрограмм и одного основного мероприятия предусмотрено 56 показателей, не выполнено 6 показателей.

Подпрограмма «Охрана и защита лесов от пожаров на территории Смоленской области»:

- Площадь проведенных сплошных санитарных рубок (га), план – 490, факт – 228,4.

- Объем проведенных сплошных санитарных рубок (м³), план – 132 300, факт – 57 270,1.

- Площадь проведенных выборочных санитарных рубок (га), план – 410, факт – 212,9.

- Объем проведенных выборочных санитарных рубок (м³), план – 15 170, факт – 13 209,1.

Причина – санитарно-оздоровительные мероприятия не выполнены арендаторами лесных участков в связи с отсутствием объемов.

- Площадь проведенной обработки почвы под лесные культуры (га), план – 2 443,8, факт – 2 043,9.

Причина – в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождливое лето и осень).

- Площадь проведенного отвода лесосек под сплошные рубки (га), план – 7 436,0, факт – 6 963,2.

Причина – невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

2.5. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области». В составе 6 основных мероприятий предусмотрено 19 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Повышение престижа военной службы в молодежной среде, и реализация комплекса воспитательных и развивающих мероприятий для допризывной молодежи»:

- Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях по повышению престижа военной службы, в молодежной среде (чел.), план – 4 500, факт – 2 950.

Причины – показатель не выполнен в связи с введением ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Мероприятия в рамках акций «День призывника» не проводились.

2.6. «Развитие культуры в Смоленской области». В составе 3 подпрограмм предусмотрено 48 показателей, не выполнено 13 показателей.

Подпрограмма «Наследие»:

- Число посетителей областных государственных музеев (тыс.чел); план – 265,8; факт – 106,103.

- Число экскурсий, проведенных областными государственными музеями (ед.); план – 5 602, факт – 2 992.

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%); план – 104,1, факт – 93.

Подпрограмма «Искусство»:

- Количество публичных выступлений (ед.); план – 880, факт – 443.

- Количество зрителей театрально-концертных мероприятий (тыс. чел.); план – 117,756, факт – 48,99.

- Количество проведенных событийных театрально-концертных мероприятий (ед.); план – 4, факт – 3.

- Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (%); план – 109, факт – 27,4.

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%); план – 104,1, факт – 76,3.

- Количество зрителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.); план – 26,744, факт – 16,458.

- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.); план – 201, факт – 182.

- Количество участников мероприятий (тыс. чел.); план – 67,34, факт – 42,354.

- Количество событийных культурно-досуговых мероприятий (ед.); план – 5, факт – 4.

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (%); план – 104,1, факт – 77,5.

Причина недостижения показателей – в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и приостановлением деятельности областных государственных учреждений на основании Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности».

2.7. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области».

В составе шести основных мероприятий и одной подпрограммы в отчетном периоде предусмотрено 34 показателя, 1 показатель не выполнен.

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»:

- Процент готовности стадионов, в отношении которых осуществлялась подготовка и установка спортивного оборудования в текущем году (процентов); план – 100, факт – 80.

Причина – в связи с неблагоприятными погодными условиями не уложены легкоатлетические дорожки. Работы будут завершены во 2 квартале 2021 года.

2.8. «Развитие здравоохранения в Смоленской области».

В составе девяти подпрограмм, ведомственной целевой программы и одного основного мероприятия предусмотрено 84 показателя, не выполнено 16 показателей.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

- Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек); план – 66, факт – 40,3;

- Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицитом человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов); план – 80,5, факт – 79,0;

- Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов от числа запланированных); план – 75,0, факт – 64,8;

- Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных); план – 99,8, факт – 67,0;

- Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных); план – 80,0, факт – 38,7;

- Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (%); план – 90,0, факт – 62,9.

Причины – эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией.

- Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (литров этанола); план – 6,4, факт – 6,8.

Причина – отсутствует культура потребления алкоголя. Хронический стресс в обществе, в том числе в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки, также способствует повышенному потреблению алкоголя и не способствует повышению ответственности у граждан за свое здоровье.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой»:

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов); план – 24,0, факт – 21,0.

Причина – снижение числа посещений в связи с введением в области повышенной готовности по Covid19 и ограничением доступности активной диспансеризации, тестирования на ВИЧ.

- Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней); план – 11,5, факт – 12,5.

Причина – длительная госпитализация пациентов с тяжелыми формами Covid19.

- Количество заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов по развитию находящейся в государственной собственности Смоленской области инфраструктуры здравоохранения с использованием механизма государственно-частного партнерства (единиц); план – 1,0, факт – 0.

Причина – незавершение процедуры оформления документов, необходимых для заключения соглашений, инвестором.

- Число донаций крови и ее компонентов (на 1 000 населения); план – 18,5, факт – 15,5.

Причина – эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

- Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений); план – 95,5, факт – 51,2.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

- Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений); план – 1,5, факт – 1,4.

Причина – ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

- Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов); план – 100, факт – 85,8.

Причина – заявительный характер выплаты.

Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»:

- Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов); план – 37,6, факт – 46,7.

Причина – общее количество жалоб на качество оказания медицинской помощи значительно уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако фиксируется увеличение доли нарушений, что говорит о том, что поступившие жалобы в большинстве были обоснованными.

- Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек); план – 131,54, факт – 119,94.

Причина – ограничение возможности для граждан пользоваться услугами в Личном кабинете «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.

2.9. «Содействие занятости населения Смоленской области». В составе трех подпрограмм предусмотрено 25 показателей, 1 показатель не выполнен.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»:

- Численность инвалидов молодого возраста, для трудоустройства которых планируется создание рабочего места (чел.); план – 2, факт – 1.

Причина – субсидия была предоставлена работодателям за 2 созданных рабочих места, одно рабочее место было создано в конце 2019 года и инвалид

трудоустроен в 2019 году, а работодатель обратился за компенсацией затрат в 2020 году.

2.10. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата». В составе двух основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 55 показателей. Выполнение 5 показателей оценить невозможно по причине отсутствия статистических сведений за 12 месяцев 2020 года. Не выполнено 3 показателя:

Подпрограмма *«Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской области»:*

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц), план – 980, факт – 819.

Причина – Постановлениями АСО от 09.10.2020 № 590 и от 23.10.2020 № 638 внесены изменения в ОГП программу «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» в части уменьшения финансирования мероприятия 3.7 областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата», что повлекло за собой уменьшение планового значения показателя 3.5 с 980 единиц до 790 единиц. Департамент инвестиционного развития Смоленской области своевременно не внес изменения в план-график.

- Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку (единиц), план – 3, факт – 0.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (единиц), план – 5, факт – 0.

Причина – показатели не выполнены в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований по мероприятиям 3.10, 3.11 ОГП «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» (ред. от 23.10.2020 № 638). Департамент инвестиционного развития Смоленской области своевременно не внес изменения в план-график.

2.11. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и трех подпрограмм предусмотрено 23 показателя, не выполнен 1 показатель.

Подпрограмма «Пожарная безопасность»:

- Количество приобретенных пожарных машин (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

2.12. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области». В составе семи основных мероприятий и двух подпрограмм предусмотрено 20 показателей, не выполнены 5 показателей.

Основное мероприятие «Возмещение затрат организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения»:

- Количество газоснабжающих организаций, которым предоставляется субсидия (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – субсидия носит заявительный характер. До настоящего времени у газоснабжающих организаций отсутствовала необходимость в предоставлении субсидий, поэтому они не обращались в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за предоставлением субсидий.

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по приобретению техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства»:

- Количество приобретенной техники (ед.); план – 7, факт – 5.

Причина – количество приобретенной техники уменьшилось в связи с увеличением стоимости техники.

Подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»:

- Количество завершенных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на модернизацию которых предоставлялись субсидии (ед.); план – 4, факт – 3.

Причина – на строительство одного объекта капитального строительства заказчиком (Озерненское сельское поселение Шумячского района) неоднократно объявлялся открытый аукцион. На аукцион подрядные организации не заявлялись, в связи с чем открытые аукционы были признаны несостоявшимися.

- Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ед.); план – 10, факт – 9.

Причина – одна проектно-сметная документация (далее – ПСД) не разработана в связи с тем, что заказчик (Козинское сельское поселение Смоленского района) поздно (III квартал 2020 г.) объявил открытый аукцион на разработку ПСД. В свою очередь подрядная организация (проектный институт) нарушила сроки выполнения работ по разработке ПСД. Заказчик по состоянию на 01.01.2020 не представил в Департамент документы, необходимые для оплаты выполненных работ.

Подпрограмма «Газификация Смоленской области»:

- Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство межпоселковых газопроводов (ед.); план – 1, факт – 0.

Причина – документация разработана, но не оплачена по причине непредставления подрядчиком отчетной документации.

2.13. «Развитие образования в Смоленской области». В составе одного основного мероприятия и восьми подпрограмм предусмотрено 76 показателей, не выполнено 10 показателей.

Подпрограмма «Развитие общего образования»:

- Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников, участвующих в едином государственном экзамене (%); план – 97,5, факт – 92.

Причина – уменьшение удельного веса произошло за счет уменьшения общего числа обучающихся, принявших участие в сдаче единого государственного

экзамена, в связи с изменением порядка проведения государственной итоговой аттестации.

- Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы спортивные залы (ед.); план – 5, факт – 4.

Причина – уменьшение отремонтированных залов в связи с перераспределением в сторону увеличения открытых плоскостных спортивных сооружений, оснащенных спортивным инвентарем и оборудованием.

- Доля муниципальных образований Смоленской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (%); план – 30, факт – 0.

Причина – увеличение сроков поставки оборудования из-за задержки поставки поставщиками.

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (да/нет); план – да, факт – нет.

Причина – увеличение сроков поставки оборудования из-за задержки поставки поставщиками.

Подпрограмма «Развитие образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

- Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получивших документы об общем образовании (чел.); план – 62, факт – 33.

Причина – уменьшилось число обучающихся, принявших участие в итоговой аттестации и получивших документы об общем образовании, остальным обучающимся с ограниченными возможностями здоровья выданы свидетельства об обучении государственного образца.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»:

- Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (%); план – 24, факт – 0.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями запланированная государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в июне 2020 года в профессиональных образовательных организациях не проводилась. В декабре 2020 года проводился демонстрационный экзамен для выпускников в рамках промежуточной аттестации.

- Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена (%); план – 6, факт – 5.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями запланированная государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в июне

2020 года в профессиональных образовательных организациях не проводилась. В декабре 2020 года проводился демонстрационный экзамен для выпускников в рамках промежуточной аттестации. В связи с ограничительными мероприятиями в виде приостановления допуска обучающихся в образовательные организации, введенными в соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», а также письмом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучию человека в Смоленской области от 11.06.2020 № 03-7371 о запрете проведения экзаменов, проведение демонстрационных экзаменов в рамках государственной итоговой аттестации было отменено.

- Количество жителей Смоленской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования (не менее тыс. чел.); план – 0,6, факт – 0.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями обучение не проводилось.

Подпрограмма «Педагогические кадры»:

- Количество молодых учителей - получателей компенсации части расходов по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом (займом) (чел); план – 17, факт – 15.

Причина – оказание мер социальной поддержки носит заявительный характер.

- Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%); план – 24, факт – 14,5.

Причина – в настоящее время тенденция уменьшения численности педагогических работников сохраняется. Зреет еще одна негативная тенденция – старение кадров. Доля работающих пенсионеров в регионе составляет 17%, что превышает среднероссийский показатель на 13,4%.

2.14. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области». В составе одного основного мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 3 показателя, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие «Предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения»:

- Количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения, нарастающим итогом (единиц); план – 11, факт – 8.

Причина – по двум объектам строительно-монтажные работы не были завершены в полном объеме (в г. Велиж в связи со срывом сроков поставки оборудования поставщиком, в д. Мерлино Краснинского района Смоленской области в связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы проектно-сметной документации). Кроме того объект в д. Корзово введен в эксплуатацию

29.01.2021 с нарушением планируемого срока.

2.15. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области». В составе трех основных мероприятий предусмотрено 8 показателей, не выполнен 1 показатель.

Основное мероприятие *«Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья»:*

- Количество проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктур для обеспечения развития жилищного строительства, разработанной в соответствующем году (единиц); план – 8, факт – 0.

Причина – в связи с поздним заключением муниципальных контрактов – последний 31.12.2020, сроки разработки ПСД перенесены на 2021 год.
