

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

### по достижению значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий по планам-графикам реализации областных государственных программ за 12 месяцев 2022 года

Департаментом экономического развития Смоленской области проведен анализ выполнения планов-графиков реализации 32 областных государственных программ (далее – ОГП) за 12 месяцев 2022 года.

В целях оценки выполнения показателей планов-графиков предлагается считать значение результата достигнутым и показатель выполненным при условии достижения его фактического значения до уровня не менее 95% от планового значения.

При проведении анализа в составе ОГП учитывались региональные проекты, ведомственные проекты и комплексы процессных мероприятий, для которых в планах-графиках реализации установлено достижение значений результатов и показателей в отчетном периоде.

Из 32 ОГП по 16 ОГП достигнуты все результаты и показатели планов-графиков реализации, по 16 ОГП не достигнут один или несколько результатов и показателей планов-графиков реализации. Всего по 32 ОГП в планах-графиках реализации на 12 месяцев 2022 года запланировано:


- 214 значений результатов региональных и ведомственных проектов, 15 (7,0%) из них не достигнуты;

- 384 показателей комплексов процессных мероприятий, 24 (6,5%) из них не выполнены и по 1 (0,3%) данные отсутствуют.

В целом ОГП выполняются в соответствии с планами-графиками реализации.



## Достижение значений результатов региональных и ведомственных проектов и показателей реализации комплексов процессных мероприятий

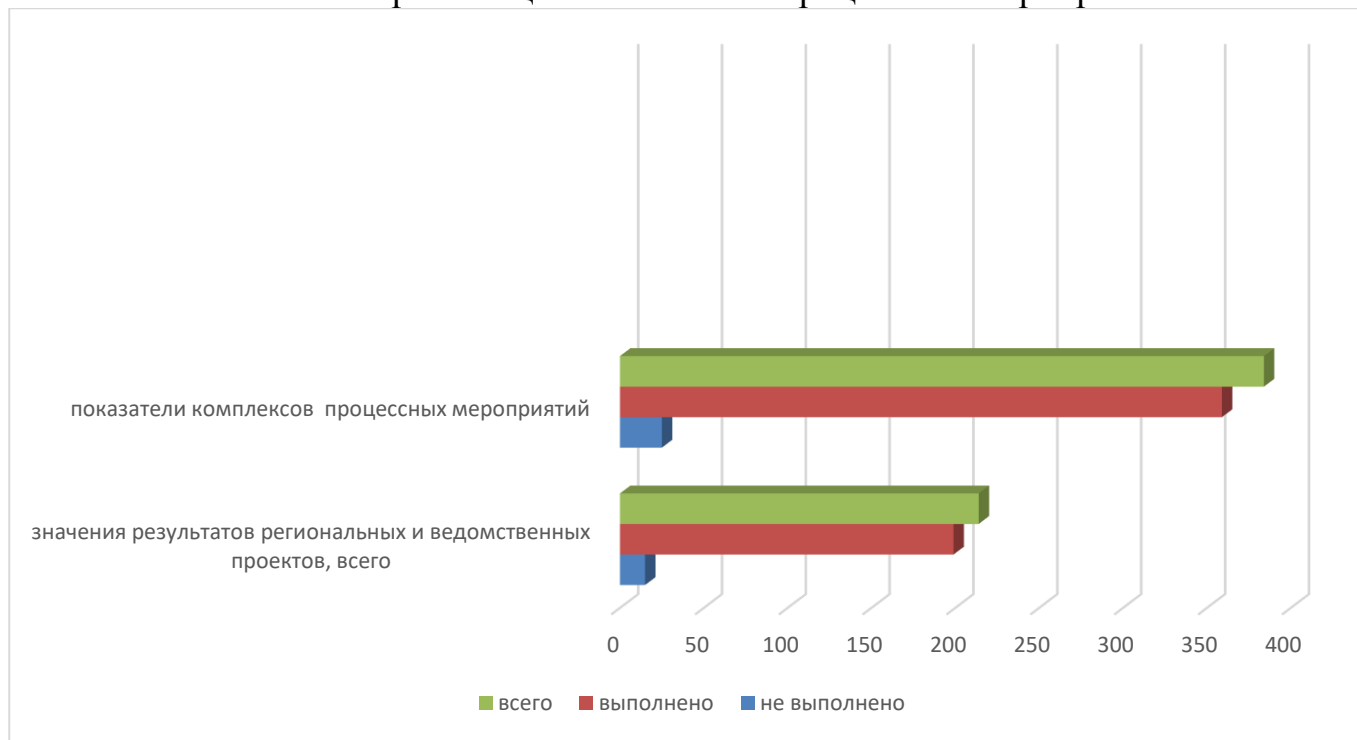

### **1. Областные государственные программы, по которым достигнуты все значения результатов региональных и ведомственных проектов и показатели реализации комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:**

**1.1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами».** В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 3 показателя.

**1.2. «Управление государственными финансами Смоленской области».** В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 2 показателя.

**1.3. «Местное самоуправление в Смоленской области».** В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя.

**1.4. «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области».** В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

**1.5. «Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области».** В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 9 показателей.

**1.6. «Развитие промышленности Смоленской области и повышение её конкурентоспособности».** В составе двух региональных проектов предусмотрено 2 значения результатов, в составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 4 показателя.

**1.7. «Создание благоприятных условий для экономического развития Смоленской области».** В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 5 показателей.

**1.8. «Информационное общество Смоленской области».** В составе четырех региональных проектов, четырех ведомственных проектов предусмотрено 37 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 7 показателей.

**1.9. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области».** В составе двух ведомственных проектов предусмотрено 3 значения результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель.

**1.10. «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».** В составе одного ведомственного проекта предусмотрено 1 значение результата, в составе четырех комплексов процессных мероприятий запланировано и достигнуто 10 показателей.

**1.11. «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата».** В составе трех региональных проектов предусмотрено 7 значений результатов. В составе пяти комплексов процессных мероприятий запланировано и достигнуто 11 показателей.

**1.12. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области».** В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 9 показателей.

**1.13. «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области».** В составе одного ведомственного проекта предусмотрено 1 значение результата. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 14 показателей.

**1.14. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области».** В составе двух региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 6 результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей.

**1.15. «Развитие государственной ветеринарной службы Смоленской области».** В составе одного регионального проекта предусмотрено 1 значение результата. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 5 показателей.

**1.16. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области».** В составе двух региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 9 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 12 показателей.

**2. Областные государственные программы, по которым не достигнуты отдельные значения результатов региональных и ведомственных проектов и**

**не выполнены показатели комплексов процессных мероприятий в планах-графиках:**

**2.1. «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области».**

В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 18 показателей, 2 показателя не выполнено.

Показатели комплекса процессных мероприятий: «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области»:

- Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и государственные услуги в сфере занятости населения, от общего числа освобожденных (%); план – 20, факт – 17,4;

- Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в органах службы занятости населения Смоленской области (%); план – 1,2, факт – 0.

Причина невыполнения – снижение числа обращений лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в органы службы занятости населения Смоленской области и отсутствие желаний у лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проходить профессиональное обучение.

**2.2. «Лесное хозяйство и животный мир Смоленской области».** В составе одного регионального проекта предусмотрено 6 значений результатов, все выполнены. В составе четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 36 показателей, не выполнено 3 показателя.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства Смоленской области»:

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем рубок осветления (м<sup>3</sup>); план – 1 069,8, факт – 975,0.

Причины невыполнения - отсутствие рынков сбыта древесины, разрыв экономических связей по реализации древесины.

- Объем рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем уборки неликвидной древесины (м<sup>3</sup>); план – 13 629,95, факт – 2 330,9.

Причины невыполнения - государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- Площадь рубок, проводимых в целях ухода за лесами путем уборки неликвидной древесины (га) ; план – 195,08, факт – 41,7.

Причины невыполнения – неисполнение подрядчиком обязательств, в рамках заключенного государственного контракта.

**2.3. «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, одного ведомственного проекта предусмотрено 12 значений результатов. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 7 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Организация государственной политики в области молодежной политики и гражданско-патриотическому воспитанию»:

- Количество заявок, поданных на ежегодный областной смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области молодежной политики, волонтерства и гражданско-патриотического воспитания (шт.); план – 15, факт – 14.

Причина невыполнения – на смотр-конкурс от органов местного самоуправления поступило 14 заявок.

**2.4. «Содействие занятости населения Смоленской области».** В составе одного регионального проекта предусмотрено одно значение результата. В составе трех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 18 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия занятости населения»:

- Численность граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения (чел.), план – 10 600, факт - 9 174.

Причина – снижение в 2022 году количества обращений граждан в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы до 18 571 человека (в 2021 году – 37 247 человек), при этом среди обратившихся в центры занятости выявляется большое количество граждан с низкой мотивацией к активному поиску работы. Так, снято с регистрационного учета за длительную неявку 6 193 гражданина, за отказ от посредничества органов службы занятости – 4 612 граждан, в связи с трудоустройством снято с учета 9 174 гражданина. Органами службы занятости населения на протяжении 2022 года анализировались причины, приводящие к низкому уровню выполнения показателя по численности граждан, трудоустроенных органами службы занятости населения, велась работа по повышению результатов его достижения. Так, за первое полугодие 2022 года трудоустроено 3 822 гражданина, а за второе полугодие – 5 351 гражданин (на 40% больше, чем в первом полугодии).

**2.5. «Развитие культуры в Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 12 значений результатов. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 29 показателей, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности»:

- Количество разработанной научно-проектной документации по объектам учреждений культуры (единиц); план – 1, факт – 0.

Причина – 26.12.2022 заключен контракт, работы по разработке научно-проектной документации по объектам учреждений культуры будут выполнены в 2023 году.

**2.6. «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта предусмотрено 9 значений результатов. В составе двух комплексов процессных

мероприятий предусмотрено 22 показателя. По итогам 12 месяцев 2022 года не достигнуто 4 значения результатов.

Результат регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

- Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности (единиц). Плановое значение результата - 1, фактическое значение результата - 0.

Причина - Подрядной организацией работы ведутся с отставанием 120 дней. Дополнительным соглашением срок завершения строительства перенесен на 2023 год.

Результаты ведомственного проекта: «Развитие физической культуры и массового спорта»:

- Осуществлен ремонт спортивных объектов (единиц). Плановое значение результата - 2, фактическое значение результата - 1.

Причина – поздние сроки начала работ по ремонту крыши в спортивной школе МО «Кардымовский район» Смоленской области и невозможность завершить их в полном объеме из-за погодных условий;

- Уровень технической готовности «умных» спортивных площадок в г. Смоленске (процентов). Плановое значение результата - 55, фактическое значение результата - 43.

Причина – невозможность завершить работы из-за погодных условий. Завершение работ предусмотрено в 2023 году;

- Закуплено оборудование для создания «умных» спортивных площадок (комплектов). Плановое значение результата - 2, фактическое значение результата - 0.

Причина - нарушение сроков поставки поставщиком. Поставка будет завершена в январе 2023 года.

**2.7. «Развитие здравоохранения в Смоленской области».** В составе девяти региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 19 значений результатов, из которых 4 не выполнены. В составе шестнадцати комплексов процессных мероприятий предусмотрено 48 показателей, 6 из которых не выполнены.

Результат регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»:

- Аккредитованы и допущены к профессиональной деятельности специалисты, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог (тыс. человек). Плановое значение результата – 8,683, фактическое значение результата – 2,882.

- Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом. Нарастающий итог (тыс. человек). Плановое значение результата – 4,1; Фактическое значение результата – 3,535.

Причина – отток специалистов на территорию соседней Московской области и в г. Москва. Высококвалифицированные специалисты уходят из учреждений туда, где выше материальное обеспечение и социальная защищенность, кроме того, участились случаи досрочного расторжения лицами, получающими высшее

медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении. Подготовка квалифицированного специалиста продолжительный процесс - 8 (7) лет. Снизилась популярность программы «Земский доктор». У медицинских организаций отсутствует служебное жилье.

Результат регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области»:

- Приобретены и смонтированы объект недвижимого имущества медицинских организаций (единиц). Плановое значение результата -10, фактическое значение результата - 9.

Причина - Игоревская врачебная амбулатория принята 24.01.2023 в связи с долгим согласованием изменений в региональную программу, реорганизацией учреждения и поздним завершением работ.

Результат ведомственного проекта «Формирование благоприятных условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи»:

- Разработана проектно-сметная документация и осуществлена реконструкция здания ОГБУЗ «Поликлиника № 6». Плановое значение результата -1. Фактическое значение результата - 0.

Причина - невыполнение поставщиком условий контракта, завершение разработки ПСД будет осуществлено в 3 квартале 2023 года.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально-значимыми инфекционными заболеваниями»:

- Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов), план – 31, факт – 27.

Причина – в связи с ограничительными мероприятиями по COVID-19.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»:

- Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную организации оказания паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (единиц), план – 29, факт – 10.

Причина - закупка части медицинских изделий медицинскими учреждениями не проведена (корректировка плана закупаемых медицинских изделий в октябре 2022 года).

- Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества (единиц), план – 10 130, факт – 9 606.

Причина невыполнения – обеспечение пациентов осуществляется в соответствии с потребностью.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Медицинская реабилитация»:

- Количество приобретенного оборудования (единиц), план – 142, факт – 138.

Причина – неисполнение поставщиком обязательств по контракту.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Кадровые ресурсы здравоохранения»:

- Количество медицинских работников, получивших единовременные выплаты (человек), план – 41, факт – 35.

Причина невыполнения – выплаты медицинским работникам носят заявительный характер.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Организация обязательного медицинского страхования»:

- Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (%), план – 33,4, факт – 30,8.

Причина невыполнения – ограничительные мероприятия по COVID-19.

**2.8. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, трех ведомственных проектов предусмотрено 14 значений результатов, из них не достигнуто 2 результата. В составе двух комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде запланировано 4 показателя, не выполнен 1 показатель.

Результат ведомственного проекта «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»:

- Модернизированы системы теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения (единиц); план – 3, факт – 1.

Причина невыполнения – низкие темпы работ подрядных организаций. В 2022 году не введены в эксплуатацию очистные сооружения в г. Гагарин и очистные сооружения в п. Монастырщина Смоленской области. Завершить все работы планируется в 2023 году.

Результат ведомственного проекта «Улучшение условий проживания населения Смоленской области»:

- Завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту общественных бань (единиц); план – 5, факт – 4.

Причина невыполнения – неудовлетворительная работа заказчика по подготовке проектно-сметной документации и по проведению аукциона по выбору подрядной организации. Реконструкция общественной бани в г. Дорогобуж не завершена. Завершить работы планируется в 2023 году.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»:

- Количество выполненных работ по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области (единиц); план – 29, факт – 13.



Причина невыполнения – высокая стоимость работ по оценке технического состояния общего имущества в многоквартирных домах - объектах культурного наследия. При этом финансовые средства освоены в полном объеме.

**2.9. «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, одного ведомственного проекта в отчетном периоде предусмотрено 9 значений результатов, из них не достигнут 1 результат.

Результат регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

- Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц, нарастающим итогом (единиц); план – 7, факт – 6.

Причина – не выполнены работы по объекту в г. Сычевка из-за позднего заключения контракта № 1 от 26.12.2022 со сроком окончания выполнения работ 30.04.2023 г.

**2.10. «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области».**

В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 13 значений результатов. В составе двух комплексов процессных мероприятий предусмотрено 6 показателей. Данные о выполнении 1 показателя отсутствуют. По итогам 2022 года не достигнуто 2 значения результата.

Результат ведомственного проекта «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»:

- Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений в части проектирования объектов автомобильных дорог (ед.); план – 5, факт – 4.

Причина – в связи с технологической сложностью объекта, подрядная организация не успела разработать проектно-сметную документацию;

Результат ведомственного проекта «Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении на территории города Смоленска Смоленской области»:

- Осуществлена разработка документов транспортного планирования города Смоленска (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – в соответствии с муниципальным контрактом от 22.09.2022 № 0163300029422000962 срок разработки документов транспортного планирования города Смоленска установлен не позднее 15.07.2023.

**2.11. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».** В составе четырех комплексов процессных мероприятий предусмотрено 13 показателей, не выполнены 2 показателя.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг, регламентация государственных и муниципальных услуг»:

- Доля регламентированных государственных услуг в соответствии с актуальными требованиями действующего законодательства (процентов); план – 100, факт – 45,4.

Причина – исполнительные органы Смоленской области, предоставляющие государственные услуги в соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 12.12.2011 № 2174-р/адм, не провели в полном объеме работу по актуализации региональных нормативных правовых актов, в том числе административных регламентов предоставления услуг в связи с внесением изменений в федеральное законодательство. В результате по состоянию на 29 декабря 2022 года 45,4% административных регламентов по предоставлению государственных услуг соответствуют областному и федеральному законодательству. Департамент цифрового развития Смоленской области проводит работу с исполнительными органами Смоленской области по актуализации административных регламентов. В 2021-2022 годах в исполнительные органы Смоленской области направлялись письма о необходимости приведения в соответствие административных регламентов по предоставлению государственных услуг в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством;

- Доля регламентированных муниципальных услуг в соответствии с актуальными требованиями действующего законодательства (процентов); план – 100, факт – 86,5.

Причина – исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области не провели в полном объеме работу по актуализации нормативных правовых актов, в том числе административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Департамент цифрового развития Смоленской области проводит работу с исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области по актуализации административных регламентов. В 2021-2022 годах в указанные органы местного самоуправления Смоленской области направлялись письма о необходимости приведения в соответствие административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

**2.12. «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области».** В составе трех региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 8 значений результатов. В составе одиннадцати комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 29 показателей комплексов процессных мероприятий, не выполнен 1 показатель.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни отдельных категорий граждан»:

- Численность граждан пожилого возраста, проживающих на территории Смоленской области в приемной семье (человек); план – 40, факт – 37.

Причина – уменьшение количества граждан пожилого возраста, проживающих в приемной семье, в связи с их смертью.

**2.13. «Развитие образования в Смоленской области».** В составе пяти региональных проектов, одного регионального проекта, реализуемого в рамках федерального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 24 значения результата, не достигнуто 2 значения результата. В составе девяти комплексов процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 44 показателя, 5 из которых не выполнены.

Результат регионального проекта «Современная школа»:

- Создано новых мест в общеобразовательных организациях, с нарастающим итогом (мест); план – 1675, факт – 575.

Причина – 20.09.2022 заключен контракт на завершение строительства школы на 1 100 мест в мкр. Соловьиная роща г. Смоленска с ООО «АРХСтрой». Срок окончания строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Соловьиная роща г. Смоленска перенесен на декабрь 2023 года.

Результат ведомственного проекта «Формирование благоприятных условий для обеспечения кадрами смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Смоленский областной образовательный комплекс - Лицей-интернат «Феникс»:

- Построены двенадцатиквартирные жилые дома для работников смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Смоленский областной образовательный комплекс - Лицей-интернат «Феникс» (объектов); план – 2, факт – 0.

Причина – дома построены, по состоянию на 01.01.2023 отсутствуют документы на ввод зданий в эксплуатацию, производится определение рыночной стоимости объектов.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»:

- Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации (человек); план – 32 000, факт – 29 515.

Причина – общее снижение количества детей дошкольного возраста на территории региона.

- Количество образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база (единиц); план – 92, факт – 4.

Причина – по г. Смоленску показатель не исполнен, конкурсные процедуры своевременно не состоялись, денежные средства возвращены в 2023 году в доход областного бюджета.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования»:

- Количество образовательных учреждений, в которых укреплена материально-техническая база (единиц); план – 61, факт – 18.

Причина – показатель не исполнен по г. Смоленску, конкурсные процедуры своевременно не состоялись, денежные средства возвращены в 2023 году в доход областного бюджета.

- Количество разработанной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации

федерального значения «Усадьба «Высокое» с получением положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы (единиц); план – 3, факт – 0.

Причина – проведены конкурентные процедуры на проведение работ по разработке ПСД, заключены контракты, работы не завершены.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Развитие профессионального образования»:

- Количество разработанной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения «Усадьба «Высокое» с получением положительного заключения (единиц); план – 2, факт – 0.

Причина – по состоянию на 01.01.2023 завершен и оплачен 1 этап работ по разработке научно-проектной документации. Положительные заключения будут получены после завершения 2 этапа работ.

**2.14. «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области».** В составе одного регионального проекта, двух ведомственных проектов предусмотрено 4 значения результата, не достигнуто 1 значение результата. В составе одного комплекса процессных мероприятий в отчетном периоде предусмотрено 2 показателя.

Результат ведомственного проекта «Создание и развитие нормативно-правовых и информационных ресурсов для обеспечения градостроительной деятельности на территории Смоленской области»:

- Обеспечена разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области (единиц); план – 16, факт – 8.

Причина – расторжение муниципальными образованиями Руднянский район и Рославльский район Смоленской области контрактов по подготовке генеральных планов и правил землепользования с подрядчиком (обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Руспроект»).

**2.15. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области».** В составе двух региональных проектов, двух ведомственных проектов предусмотрено 12 значений результатов. В составе одного комплекса процессных мероприятий предусмотрен 1 показатель. Не достигнуто 1 значение результата.

Результат ведомственного проекта «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства Смоленской области»:

- Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гектаров). Плановое значение результата - 5, фактическое значение результата - 4,7.

Причина – сложности при сбыте продукции. Льноволокно и котонин в основном экспортировались в страны ЕС. Из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации, возникли трудности с доставкой продукции.

**2.16. «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области».** В составе одного регионального проекта в отчетном периоде предусмотрено 4 значения результата. Не достигнуто 1 значение результата.

Результат регионального проекта «Чистая вода»:

- Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом (шт.); план – 32, факт – 25.

Причина – в соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Чистая вода» от 12.12.2022 № 069-2020-F5001-67/5 значение показателя на 2022 год скорректировано с 32 на 25 шт. Однако внести изменения в областную государственную программу возможно только после корректировки паспорта федерального проекта. Изменения в паспорт федерального проекта «Чистая вода» были утверждены 29.12.2022, внести соответствующие изменения в паспорт регионального проекта «Чистая вода» и областную государственную программу в 2022 году не представилось возможным. По состоянию на 01.01.2023 года введено в эксплуатацию 25 объектов. Показатель, установленный паспортом федерального проекта «Чистая вода», достигнут.
